

Planificación Ciclo 2

Grupo 6:

Guillermo Guhl Arruabarrena

Daniel Gomarín Ruesga

Marcos Romero Villodres

Carlos Sobrino Martin

Javier Pozuelo Ruiz

Índice

1. Explicación del Diagrama de Gantt

El siguiente diagrama de Gantt detalla la planificación y la asignación de las tareas a lo largo del proyecto. La información se corresponde con las estimaciones de esfuerzo total de 65 horas (13 horas por integrante). En esta versión, se ha trasladado la tarea de revisión de código de Carlos al bloque de gestión de calidad.

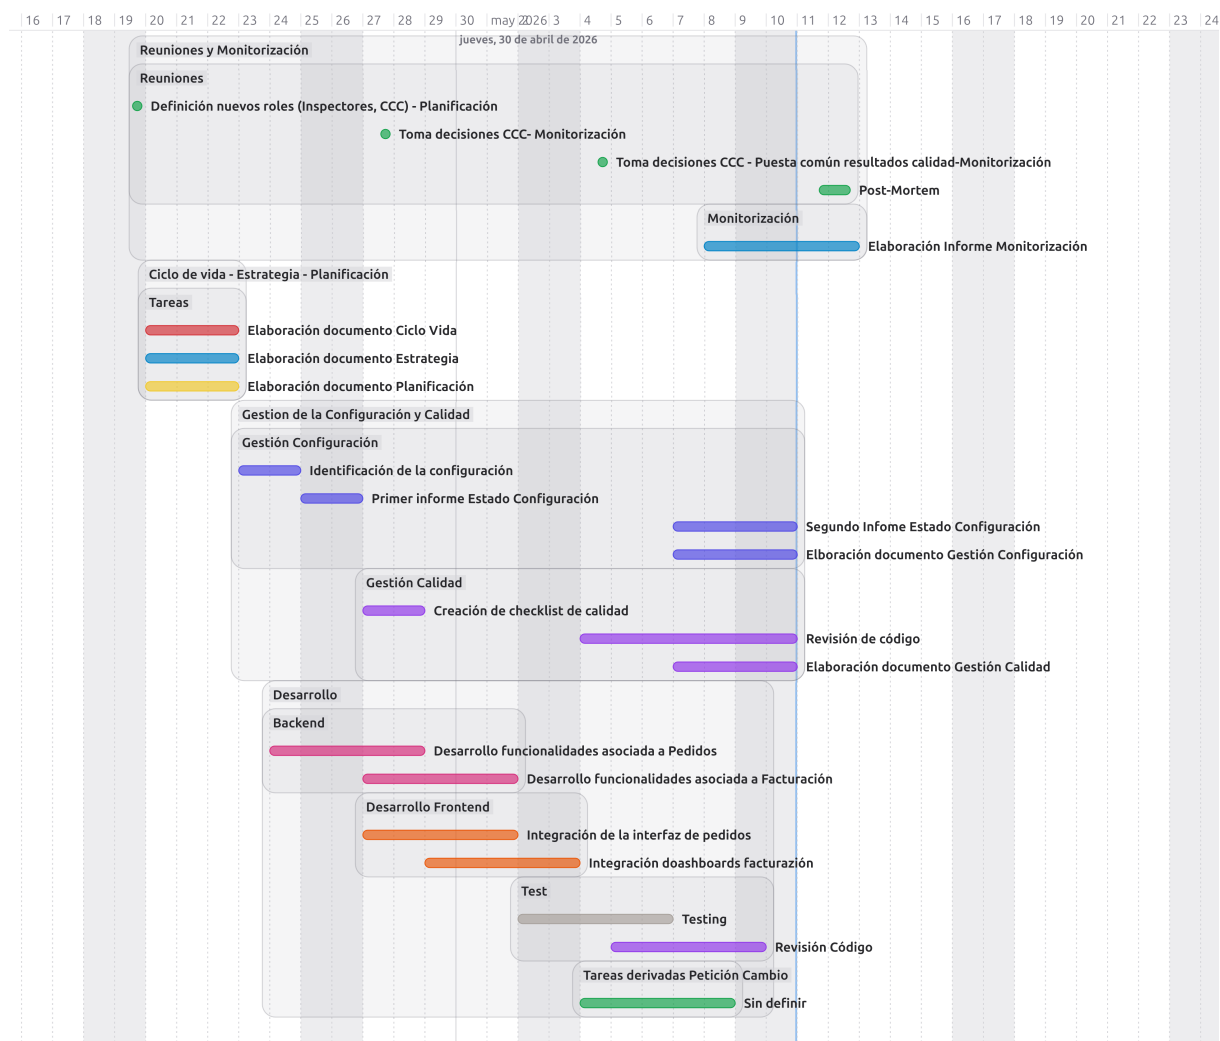


Figura 1: Diagrama de Gantt de las tareas planificadas.

A continuación, se detalla el desglose de las tareas respetando la estructura del diagrama:

- **Reuniones y Monitorización (22h):**
 - **Reuniones** (Asignada a: Todos): 15h totales.

- Definición nuevos roles (Inspectores, CCC) - Planificación
 - Toma decisiones CCC- Monitorización
 - Toma decisiones CCC - Puesta común resultados calidad-Monitorización
- **Post-Mortem** (Asignada a: Todos): 5h totales.
- **Monitorización:**
 - Elaboración Informe Monitorización (Daniel: 2h)
- **Ciclo de vida - Estrategia - Planificación** (3h):
 - **Tareas:**
 - Elaboración documento Ciclo Vida (Guillermo: 1h)
 - Elaboración documento Estrategia (Guillermo: 1h)
 - Elaboración documento Planificación (Javier: 1h)
- **Gestion de la Configuración y Calidad** (13h):
 - **Gestión Configuración** (Responsable: Marcos):
 - Identificación de la configuración (1h)
 - Primer Informe Estado Configuración (1h)
 - Segundo Informe Estado Configuración (1h)
 - Elaboración documento Gestión Configuración (1h)
 - **Gestión Calidad:**
 - Creación de checklist de calidad (Carlos: 2h)
 - Revisión de código (Guillermo: 3h)
 - Revisión Código (Carlos: 2h)
 - Elaboración documento Gestión Calidad (Carlos: 2h)
- **Desarrollo** (27h):
 - **Backend:**
 - Desarrollo Funcionalidades asociada a Pedidos (Javier: 3h)
 - Desarrollo Funcionalidades asociada a Facturación (Marcos: 2h, Guillermo: 3h)
 - **Desarrollo Frontend:**
 - Integración de la interfaz de pedidos (Daniel: 3h, Javier: 4h)
 - Integración dashboards facturación (Daniel: 3h, Marcos: 2h)
 - **Test:**
 - Testing (Carlos: 2h)
 - **Tareas derivadas Petición Cambio:**
 - Sin definir (Asignada a Todos: 1h por persona, 5h totales)

2. Estimación Global de Esfuerzo

Resumen del esfuerzo total estimado por fase (Total: 65 horas).

Fase / Grupo	Esfuerzo Estimado
Reuniones y Monitorización	22 h
└ Reuniones de seguimiento (3)	15 h
└ Post-Mortem	5 h
└ Monitorización	2 h
Ciclo de vida - Estrategia - Planificación	3 h
└ Tareas de Documentación	3 h
Gestion de la Configuración y Calidad	13 h
└ Gestión Configuración	4 h
└ Gestión Calidad	9 h
Desarrollo	27 h
└ Backend	8 h
└ Desarrollo Frontend	12 h
└ Test	2 h
└ Tareas derivadas Petición Cambio	5 h
TOTAL DEL PROYECTO	65 horas

3. Estimación de Esfuerzo por Persona

Distribución de tareas por integrante (13h totales por persona).

Integrante	Tareas	Total
Daniel Gomarín	- Transversales (Reuniones + Post-Mortem + Petición): 5h - Elaboración Informe Monitorización: 2h - Integración de la interfaz de pedidos: 3h - Integración doashboards facturación: 3h	13 h
Marcos Romero	- Transversales (Reuniones + Post-Mortem + Petición): 5h - Tareas de Gestión Configuración: 4h - Desarrollo Funcionalidades asociada a Facturación: 2h - Integración doashboards facturación: 2h	13 h

Integrante	Tareas	Total
Javier Pozuelo	- Transversales (Reuniones + Post-Mortem + Petición): 5h - Elaboración documento Planificación: 1h - Desarrollo Funcionalidades asociada a Pedidos: 3h - Integración de la interfaz de pedidos: 4h	13 h
Guillermo Guhl	- Transversales (Reuniones + Post-Mortem + Petición): 5h - Elaboración documento Ciclo Vida: 1h - Elaboración documento Estrategia: 1h - Revisión de código (Gestión Calidad): 3h - Desarrollo Funcionalidades asociada a Facturación: 3h	13 h
Carlos Sobrino	- Transversales (Reuniones + Post-Mortem + Petición): 5h - Creación de checklist de calidad: 2h - Elaboración documento Gestión Calidad: 2h - Revisión Código (Calidad): 2h - Testing: 2h	13 h
ESFUERZO GLOBAL DEL PROYECTO		65 h
